



30.11.2020

Pasi Aho

Datahub-hankkeen ajankohtaiskatsaus

Fingridin sähkömarkkinatoimikunta 04/2020

9.12.2020

FINGRID
Datahub


Missä mennään?

- Datahubin 1.0 scope on lukittu (prosessidokumentaatio versio 1.12). Versioon tehdään tarvittaessa ainoastaan aivan välttämättömimmät muutokset/kehitykset, joiden tekemättä jättäminen estää datahubin käyttöönoton. Kaikki muut tarpeet ja toiveet siirretään ”toiveiden tynnyriin”.
- Versiossa 1.12 on tarkennettavaa, joita Fingrid on tuonut tietämyskannan kautta toimialalle tietoon sitä mukaan kun niitä on löytynyt. Tämän vuoden aikana nämä tuodaan myös itse dokumentaatioon.
- Datahub-järjestelmän koko kehitysvaihe on saatu päätökseen. Tällä hetkellä on menossa viralliset tehdastestit ja niiden jälkeen Fingrid aloittaa tammikuun alussa viralliset vastaanottotestit (kesto 4 kk). Kehitysvaiheen aikana järjestelmää on testattu runsaasti ja tulokset ovat olleet rohkaisevia mm. suorituskyvyn osalta.
- Järjestelmän on-prem tuotantoympäristöjen laitteet on hankittu ja niiden asennukset ovat tällä hetkellä menossa


Markkinaosapuolten sertifiointin tilanne

- 1-luokan sertifioituneiden määrä kasvaa tasaisesti ja vauhti on kiihtynyt loppua kohti varsinkin verkkoyhtiöillä
- Tilanne 30.11.
 - 69 jakeluverkkoyhtiötä
 - 52 myyjää


Sertifioidut osapuolet

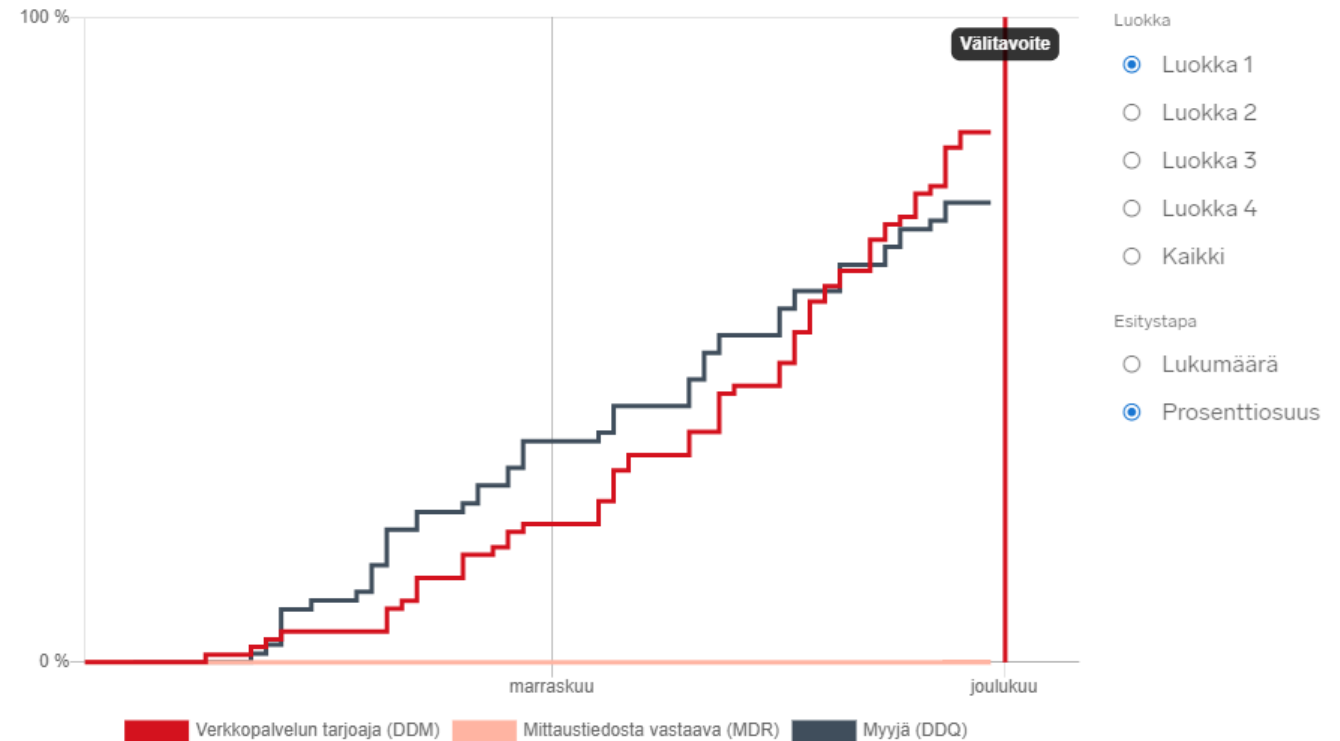

Vuoden 2020 välitavoitteet

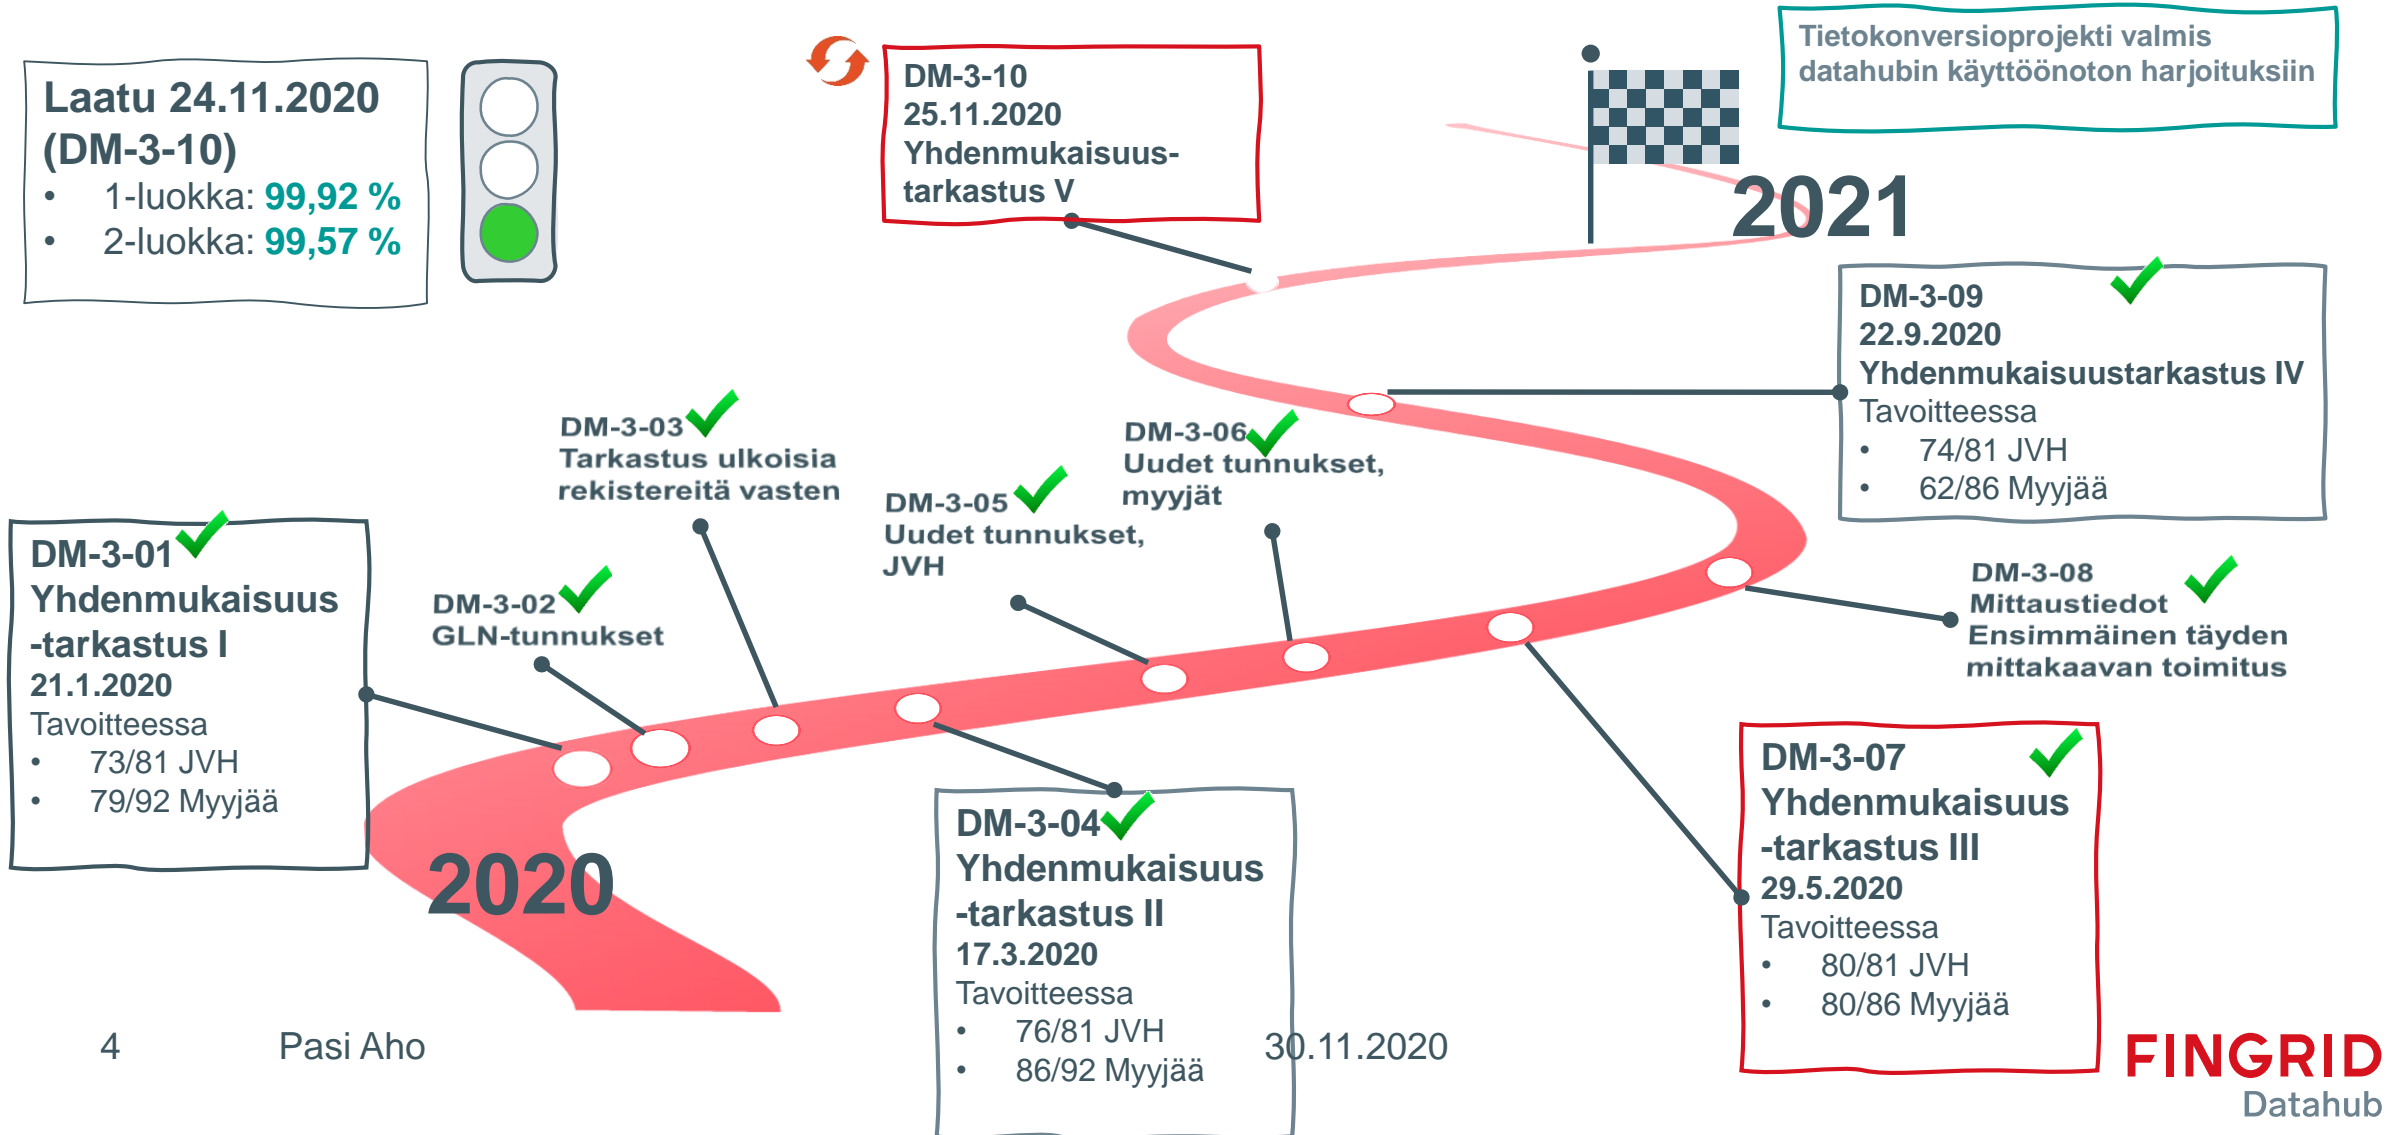

Tietokonversion 4. -vaihe

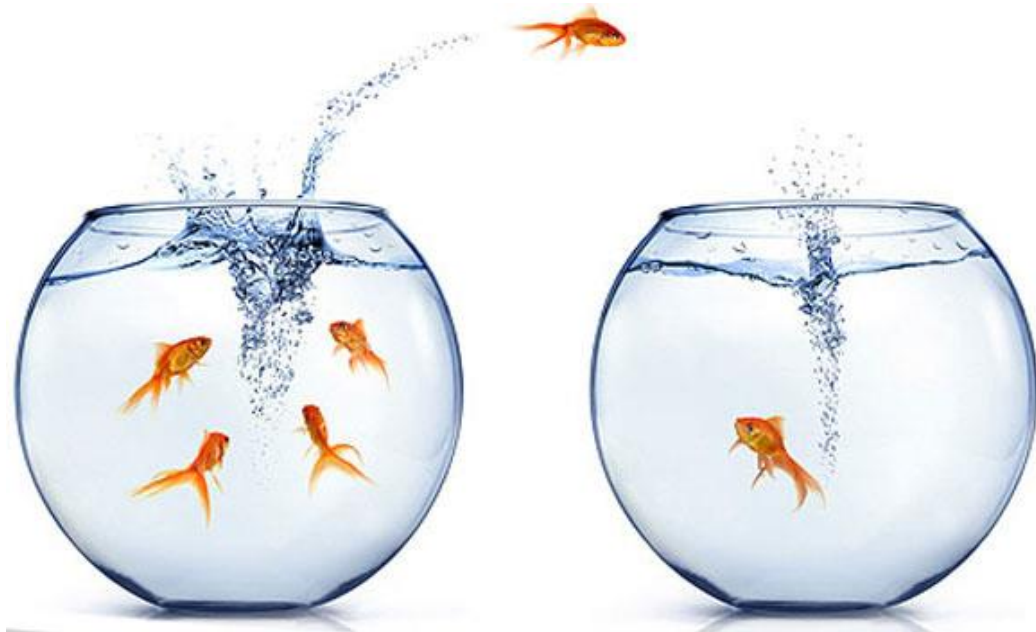


- **Tietokonversioprojektin käyttöönottoharjoituksia**
 - Kaikki tiedot ladataan datahubiin asti ja verifioidaan datahubissa
 - Henkilötietojen luovuttaminen edellyttää erillisen sopimuksen Fingrid Datahubin ja osapuolten välillä
 - Vaiheessa käytetään tietoturvatarkastettua ”on premises” -ympäristöä
 - Tuotannollisen koekäytön esivaihe, jolla varmistetaan, että datahub-järjestelmä pystytään alustamaan tuotannollista koekäyttöä varten

- Tuotannollisen koekäytön ohjeen uusin versio julkaistiin viikolla 46.
- Järjestelmätoimittajayhteistyö jatkuu aktiivisena. Syksyllä tavattu vähintään kerran kaikki järjestelmätoimittajat. Osan kanssa tehty tiivistäkin työtä ja hankkeiden edistämistä.
- Järjestelmätoimittajaklinikat jatkuvat. Edellinen klinikka pidettiin 3.11.2020 jossa aiheina oli mm. sertifiointitestausta, varttimittaukseen ja varttitaseeseen varautuminen datahubissa. Seuraava klinikka (nro 7) pidetään 10.12.2020. Tässä klinikassa jatketaan varttimittauksen ja varttitaseen käsittelyä datahubissa ja käsitellään muita datahubin osa-alueita osallistujilta saatujen ennakkokysymysten perusteella.
- Palvelusopimuskokonaisuus ollut lausunnolla. Kokonaisuuteen saatiin kommentteja 21 eri osapuolelta, yhteenliittymältä tai etujärjestöltä. Tällä hetkellä kommenttien läpikäynti ja kokonaisuuden viimeistely on käynnissä. Palvelusopimuskokonaisuus annetaan EV:lle vahvistettavaksi marraskuun loppuun mennessä. Kommenttien läpikäynti niin seurantaryhmässä (21.12.2020) kuin webinaarissa (15.12.2020).
- Toimiala on selvästi aktivoitunut, esimerkiksi lokakuun aikana datahubin palveluportaaliin tuli yhteensä n. 300 ”tikettiä”.

Pakolliset välitavoitteet ohjaavat toimialan tekemistä ja kertovat tilanteen



Datahubin ja varttitaseen sidonnaisuudet

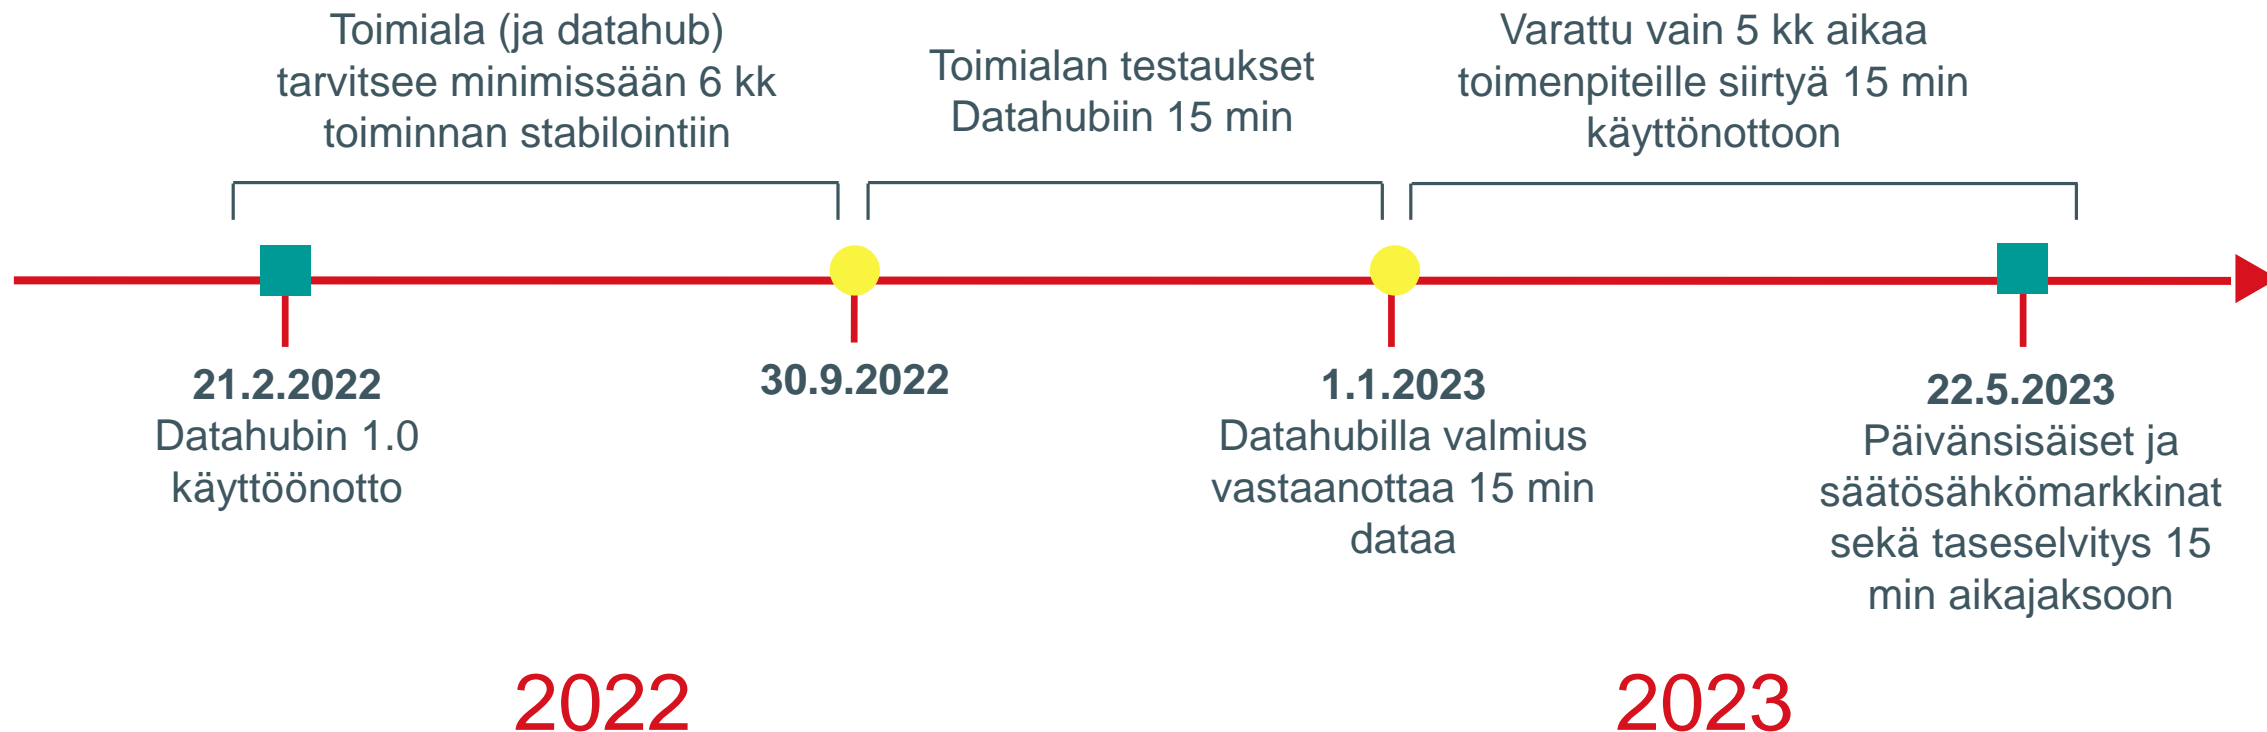

Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oy Lökkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5

www.fingrid.fi



FINGRID
Datahub
